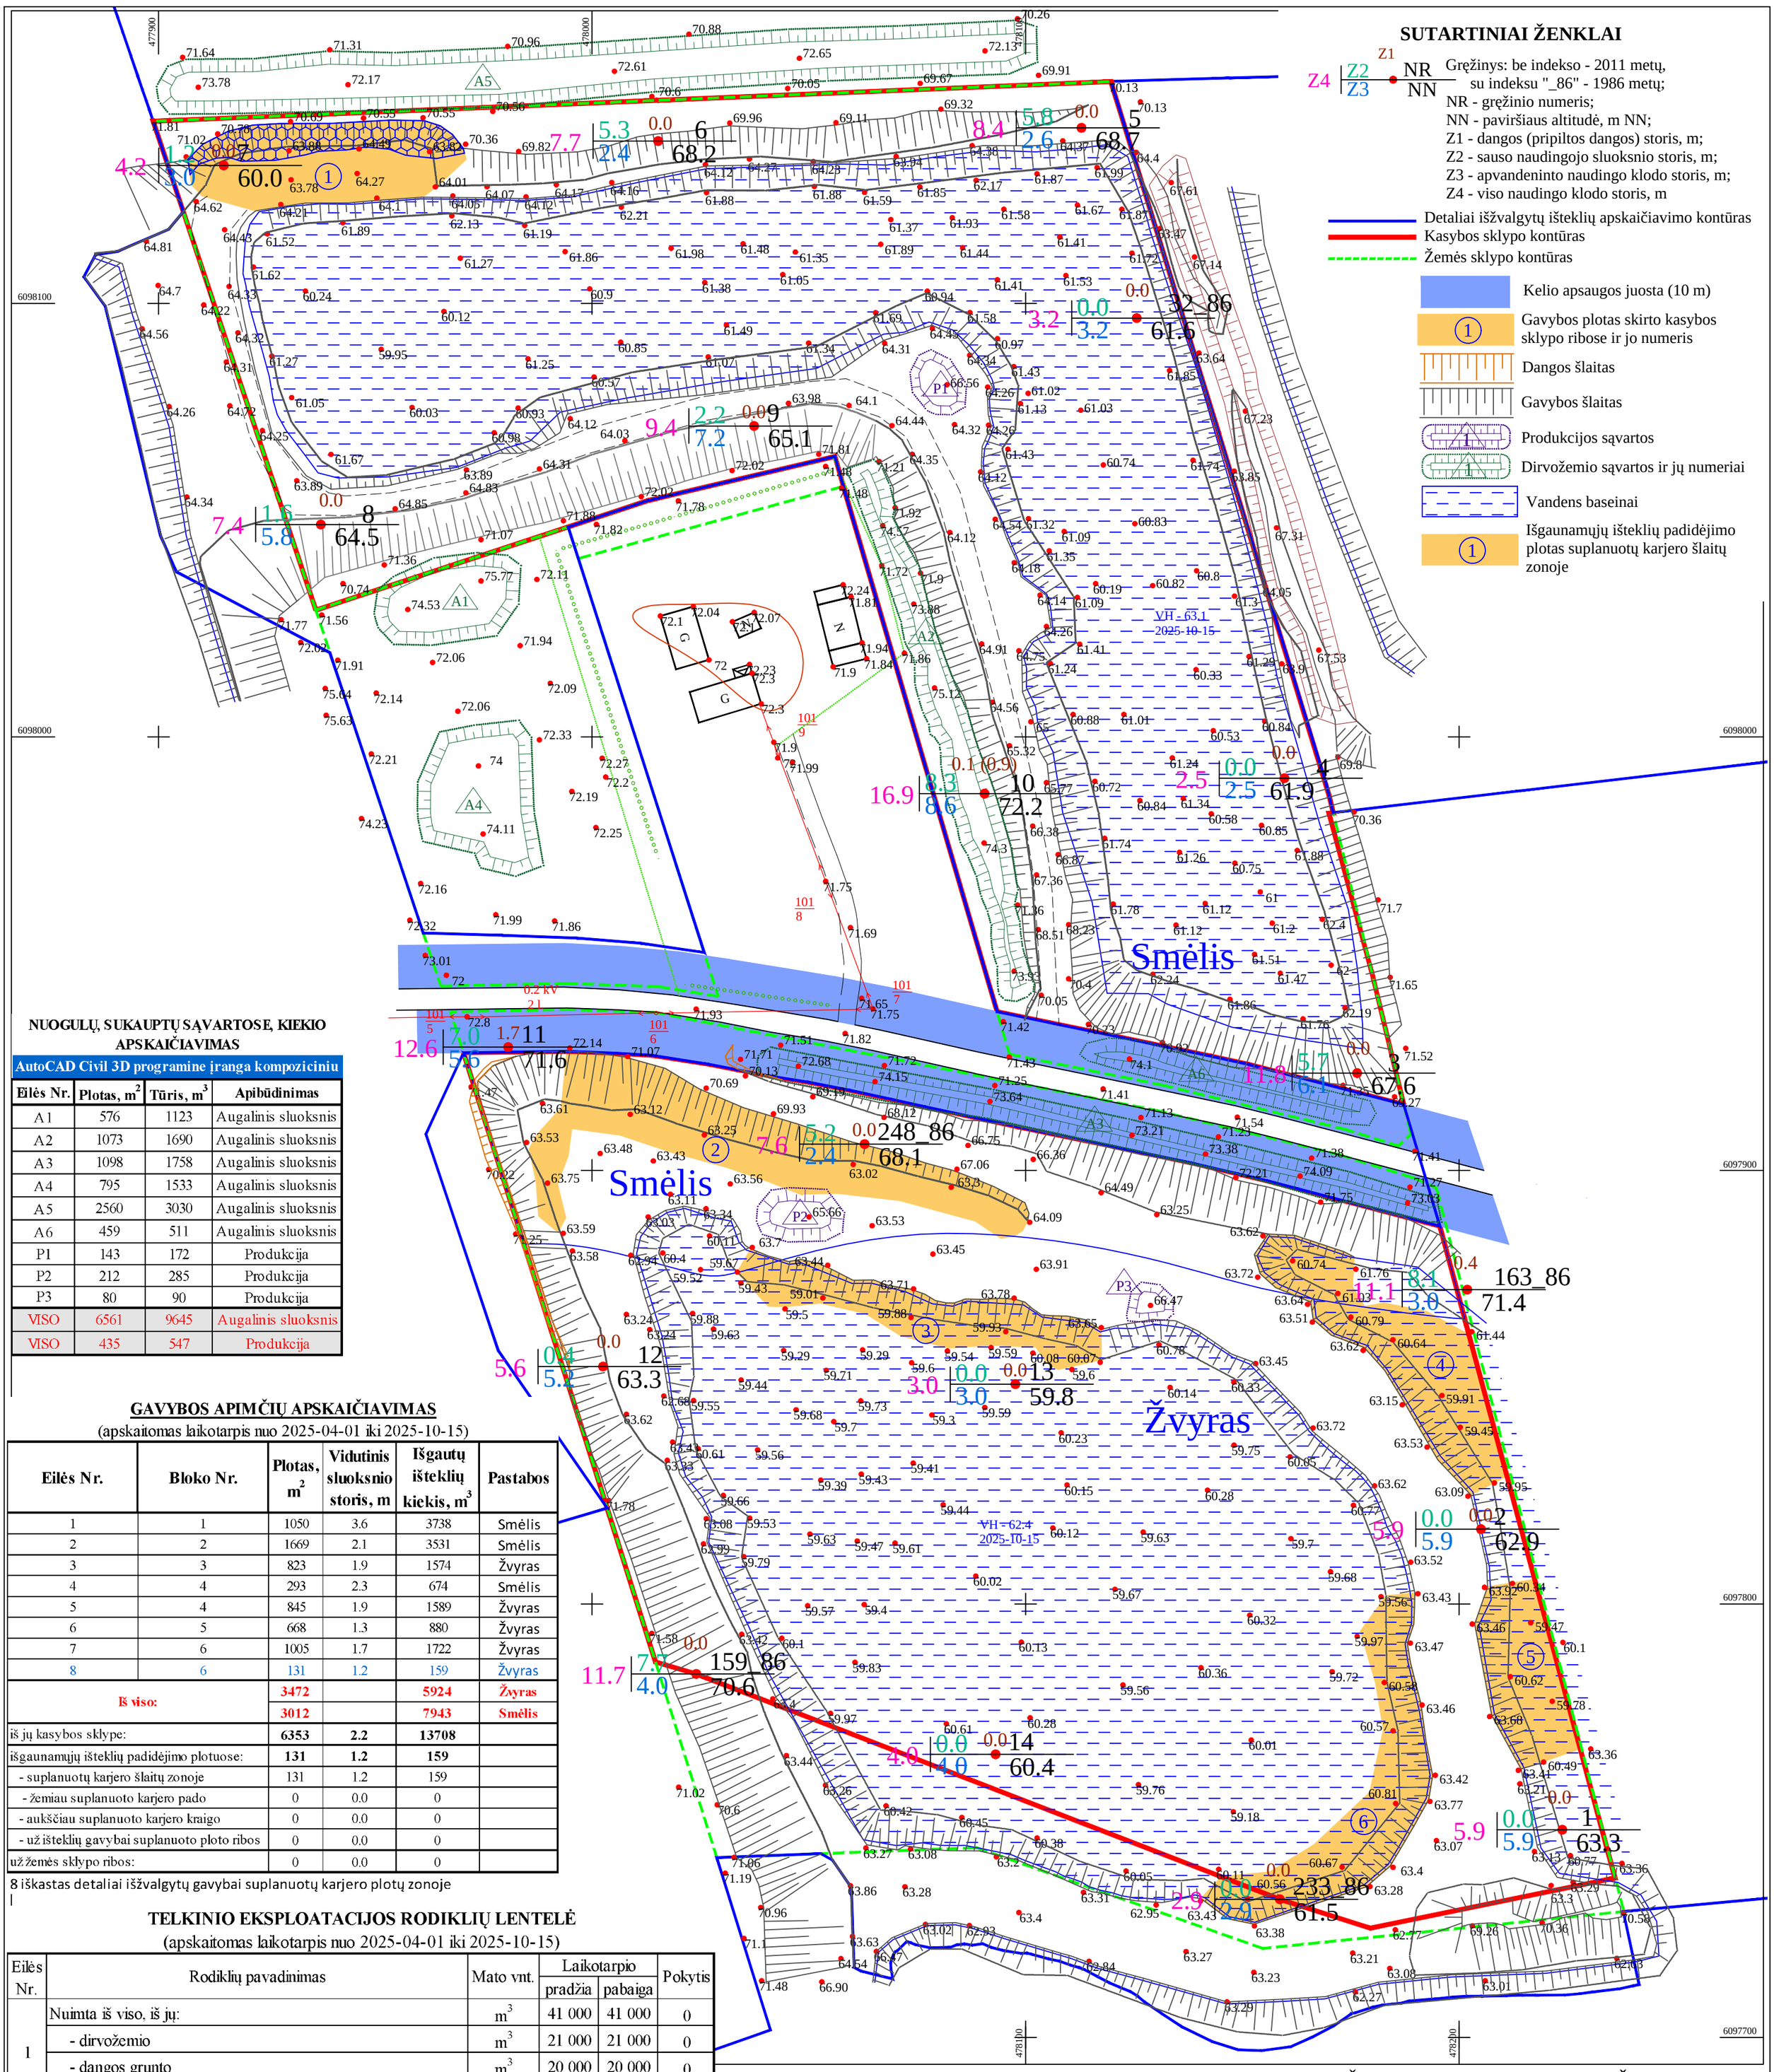

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Z4 | Z2 / Z3 — NR / NN (Z1)

Gręžinys: be indekso - 2011 metų, su indeksu "_86" - 1986 metų;
NR - gręžinio numeris;
NN - paviršiaus altitudė, m NN;
Z1 - dangos (pripiltos dangos) storis, m;
Z2 - sauso naudingojo sluoksnio storis, m;
Z3 - apvandeninto naudingo klodo storis, m;
Z4 - viso naudingo klodo storis, m

- Detaliai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūras
- Kasybos sklypo kontūras
- Žemės sklypo kontūras
- Kelio apsaugos juosta (10 m)
- (1) Gavybos plotas skirto kasybos sklypo ribose ir jo numeris
- Dangos šlaitas
- Gavybos šlaitas
- Produkcijos sąvartos
- Dirvožemio sąvartos ir jų numeriai
- Vandens baseinai
- (1) Išgaunamųjų išteklių padidėjimo plotas suplanuotų karjero šlaitų zonoje

NUOGULŲ, SUKAUPTŲ SĄVARTOSE, KIEKIO APSKAIČIAVIMAS

AutoCAD Civil 3D programine įranga kompoziciniu

Eilės Nr.	Plotas, m^2	Tūris, m^3	Apibūdinimas
A1	576	1123	Augalinis sluoksnis
A2	1073	1690	Augalinis sluoksnis
A3	1098	1758	Augalinis sluoksnis
A4	795	1533	Augalinis sluoksnis
A5	2560	3030	Augalinis sluoksnis
A6	459	511	Augalinis sluoksnis
P1	143	172	Produkcija
P2	212	285	Produkcija
P3	80	90	Produkcija
VISO	6561	9645	Augalinis sluoksnis
VISO	435	547	Produkcija

GAVYBOS APIMČIŲ APSKAIČIAVIMAS

(apskaitomas laikotarpis nuo 2025-04-01 iki 2025-10-15)

Eilės Nr.	Bloko Nr.	Plotas, m^2	Vidutinis sluoksnio storis, m	Išgautų išteklių kiekis, m^3	Pastabos
1	1	1050	3.6	3738	Smėlis
2	2	1669	2.1	3531	Smėlis
3	3	823	1.9	1574	Žvyras
4	4	293	2.3	674	Smėlis
5	4	845	1.9	1589	Žvyras
6	5	668	1.3	880	Žvyras
7	6	1005	1.7	1722	Žvyras
8	6	131	1.2	159	Žvyras
Iš viso:		3472		5924	Žvyras
		3012		7943	Smėlis
iš jų kasybos sklype:		6353	2.2	13708	
išgaunamųjų išteklių padidėjimo plotuose:		131	1.2	159	
- suplanuotų karjero šlaitų zonoje		131	1.2	159	
- žemiau suplanuoto karjero pado		0	0.0	0	
- aukščiau suplanuoto karjero kraigo		0	0.0	0	
- už išteklių gavybai suplanuoto ploto ribos		0	0.0	0	
už žemės sklypo ribos:		0	0.0	0	

8 iškastas detaliai išžvalgytų gavybai suplanuotų karjero plotų zonoje

TELKINIO EKSPLOATACIJOS RODIKLIŲ LENTELĖ

(apskaitomas laikotarpis nuo 2025-04-01 iki 2025-10-15)

Eilės Nr.	Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Laikotarpio pradžia	Laikotarpio pabaiga	Pokytis
1	Nuimta iš viso, iš jų:	m^3	41 000	41 000	0
	- dirvožemio	m^3	21 000	21 000	0
	- dangos grunto	m^3	20 000	20 000	0
	- bergždo	m^3	0	0	0
2	Naudingųjų iškasenų išteklių likutis (skirto kasybos sklypo ribose)	m^3	185 000	171 250	-13 750
	iš jo - žvyro	m^3	50 000	44 235	-5 765
	iš jo - smėlio	m^3	135 000	127 015	-7 985
3	Naudingosios iškasenos nuostoliai, iš jų:	m^3	162 000	162 042	42
	- kraige, žvyro	m^3	1 000	1 000	0
	- kraige, smėlio	m3	2 000	2 042	42
	- dugne, smėlis	m3	46 000	46 000	0
	- dugne, žvyras	m3	40 000	40 000	0
	- šlaituose ir nejudinamoje telkinio pakraščio juostoje, smėlis	m3	63 000	63 000	0
	- šlaituose ir nejudinamoje telkinio pakraščio juostoje, žvyras	m3	10 000	10 000	0
	- kiti	m3	0	0	0
4	Sukauptos kasybos atliekos	m3	0	0	0
5	Žemės sklypo (ų) plotas	ha	7	7	0
6	Rekultivavimo plotai:				
	– suderinti rekultivuoti	ha	0.0	0.7	0.7
	– rekultivuoti	ha	0.0	0.0	0.0

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMAS

(apskaitomas laikotarpis nuo 2025-04-01 iki 2025-10-15)

Eilės Nr.	Nuostolių susidarymo vieta	Plotas, m^2	Vidutinis sluoksnio storis, m	Nuostolių kiekis, m^3
1	Kraigas, smėlis	421	0.1	42
Viso nuostolių kraige apskaitomu laikotarpiu:				42
Viso nuostolių dugne apskaitomu laikotarpiu:				0
Viso kitų nuostolių apskaitomu laikotarpiu:				0

6 Grafinis priedas

TELKINIO NAUDOTOJAS:
UAB „Kvesų žvyras“
Įm. k. 302839317
Vakarės g. 13, Užpjaunių k., Šakių r.
LT-71331

TELKINIO PAVADINIMAS:
Kvesų telkinys

TELKINIO ADRESAS:
Kauno rajonas Batniavos seniūnija

Leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr.:
5-13

PLANO RENGĖJAS:
UAB „GJ MAGMA“
Įm. k. 121428749
Vaidevučio g.18, LT- 08402,Vilnius

Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82

Markšeiderinis planas sudarytas 2025 metų spalio mėn. 1 d.
UAB "GJ Magma" atliktos topografinės nuotraukos pagrindu.
Geodezininkas Martynas Trakymas (geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-1771, išdavimo data 2022-06-23)

Mastelis	M 1:1 000	MARKŠEIDERINIS PLANAS	Koordinačių sistema: LKS-94
Sudarė		Donatas Azaravičius 2025-10-17	Aukščių sistema: LAS-07
Kasybos darbų vadovas		Mindaugas Mažeika KDVP Nr. 0000, data 2000-00-00	Lapas: 1 Lapų: 1
